Plano de Ação

001 - 2018

Desenvolvimento - AcessoPASS

Sumário

1. Planejamento	3
1.1 Objetivo	
1.2 Prazo	
1.3 Recursos	
2. Cronograma	
2.1 Mapeamento	
3. Monitoramento	
4 Encerramento	

1. Planejamento

1.1 Objetivo

O Plano de Ação 001-2018 tem como objetivo definir os pontos principais para o desenvolvimento do novo produto

da empresa, o AcessoPASS, assim como listar os possíveis riscos durante os meses de execução do mesmo.

1.2 Prazo

O prazo estipulado para o projeto é de 6 meses considerando as etapas de planejamento, execução e encerramento.

1.3 Recursos

Ao longo desses meses, serão necessários os seguintes recursos:

- 1.3.1 Humano: dois desenvolvedores front-end, dois desenvolvedores back-end, um desenvolvedor SQL, um analista funcional e um tester.
- 1.3.2 Material: um notebook novo para o novo colaborador da área de testes.
- 1.3.3 Financeiro: o valor do projeto é de R\$230.000,00 que deverá cobrir os salários dos colaboradores envolvidos e também para o material que for necessário durante a execução do projeto.

2. Cronograma

Atividades	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1. Extração de						
Requisitos						
2. Desenvolvimento						
do Código						
3. Desenvolvimento						
do Banco de Dados						
4. Desenvolvimento						
da Interface (UX)						
5. Execução dos						
Testes						
6. Correções						
7. Homologação						
8. Reunião de						
Equipe						
9. Treinamento						
10. Entrega Final -						
Produção						


2.1 Mapeamento

5W					2H		Ctatu
What	Why	Where	Who	When	How	How Much	Statu s
Extração de Requisitos	Conhecer as necessidad es do Cliente	Escritório do Cliente	Analista Funciona I	1º Mês	Reuni ão com usuár ios chave do siste ma	Será pago o deslocam ento do analista até o escritório	Não Inicia do
Avaliar regras de negócio com os desenvolve dores backend	Verificar a possibilidad e do desenvolvi mento	Sala 04 do Escritório da Acesso	Analista Funciona I e os Desenvol vedores Back-End	2º Mês	Reuni ão de Equip e e Codifi cação	CLT	Não Inicia do
Mapeamen to Entidade Relacional e Desenvolvi mento do	Estudar tabelas, esquemar e estruturar o	Baia do Desenvolv edor	Desenvol vedor SQL	2º, 3º e 4º Mês	Codifi cação Indivi dual	CLT	Não Inicia do

Banco de Dados	banco da aplicação.						
Desenvolvi mento da interface com o usuário do sistema.		Baia dos Desenvolv edores	Desenvol vedores Front- End	2º, 3º e 4º Mês	Codifi cação Indivi dual	CLT	Não Inicia do
Execução dos Testes	Verificar se após a codificação o sistema está de acordo com a extração de requisitos e com o solicitado pelo Cliente	Baia do Analista de Testes	Analista de Testes	4º e 5º Mês	Cená rios de Teste s e Casos de Uso	CLT	Não Inicia do
Corretivas	Realizar as correções encontrada s pelo analista de teste.	Baia dos Desenvolv edores	Desenvol vedores Back-end e Front- end	4º e 5º Mês	Corre ções no códig o	CLT	Não Inicia do
Homologaç ão	Colocar o sistema para ser homologad o pelo Cliente	Cliente	Usuários chave do sistema	5º Mês	Usuá rio irá testa r o siste ma	Sem custo	Não Inicia do
Treinament o	Colaborado r da Acesso deverá treinar os usuários do sistema no Cliente	Cliente	Analista Funciona I	5º e 6º Mês	Anali sta Funci onal da Acess o ficará aloca do no client e para trein ar os	Todos as despesas que o analista tiver serão pagos pelo Cliente	Não inicia do

					usuár		
					ios		
Produção	Após homologad o, o sistema será colocado em produção.	Cliente	Disponív el para o Cliente	6ºMê s	softw are pode rá ser utiliz ado por todos os usuár ios da empr	Sem custo	Não Inicia do
					esa		

3. Monitoramento

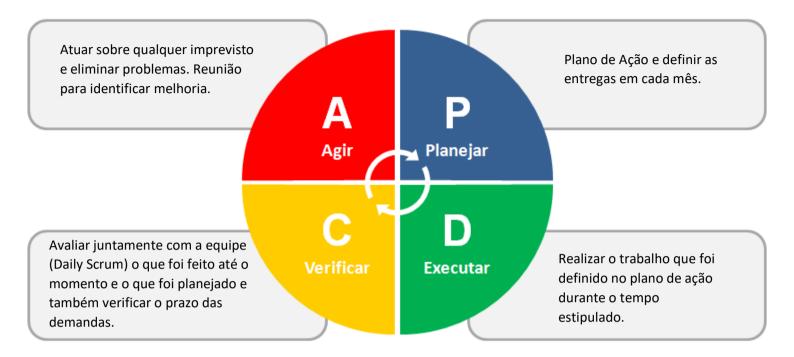

4. Encerramento

Rever o Plano de Ação e empregar software AcessoPASS em produção!

